



PMO Roadmap

Update By: Nuntawan Phoonkerd

Update Date: 07-05-2026



Objective



To support as a **Strategic Value Partner**. Drive and push to achieve our target of THB 4,000 in 2026.

2026 Revenue Projection




Base Case

Total 4,000 MB

2026 Backlog 3,000

Backlog 1,200 + New 2,800

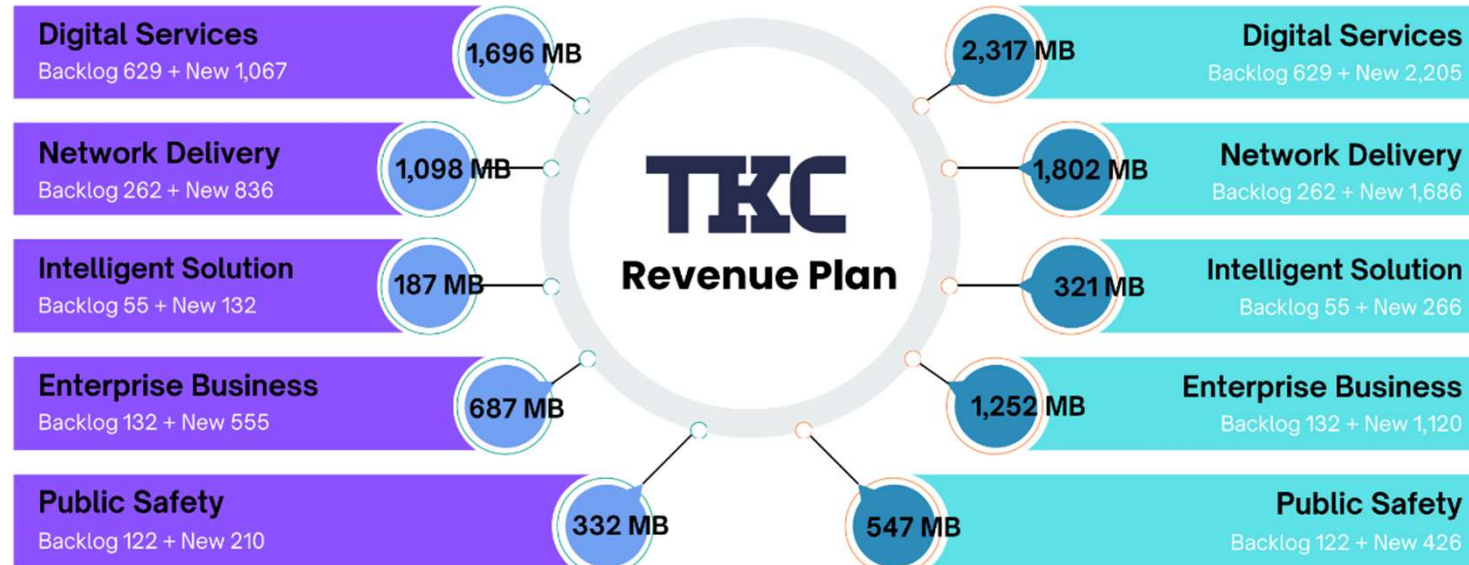

Best Case


Total 6,903 MB

Backlog 1,200 + New 5,703

Win 2025 : 1,178 MB

Bid Q4 2025 : 2,688 MB

Objective

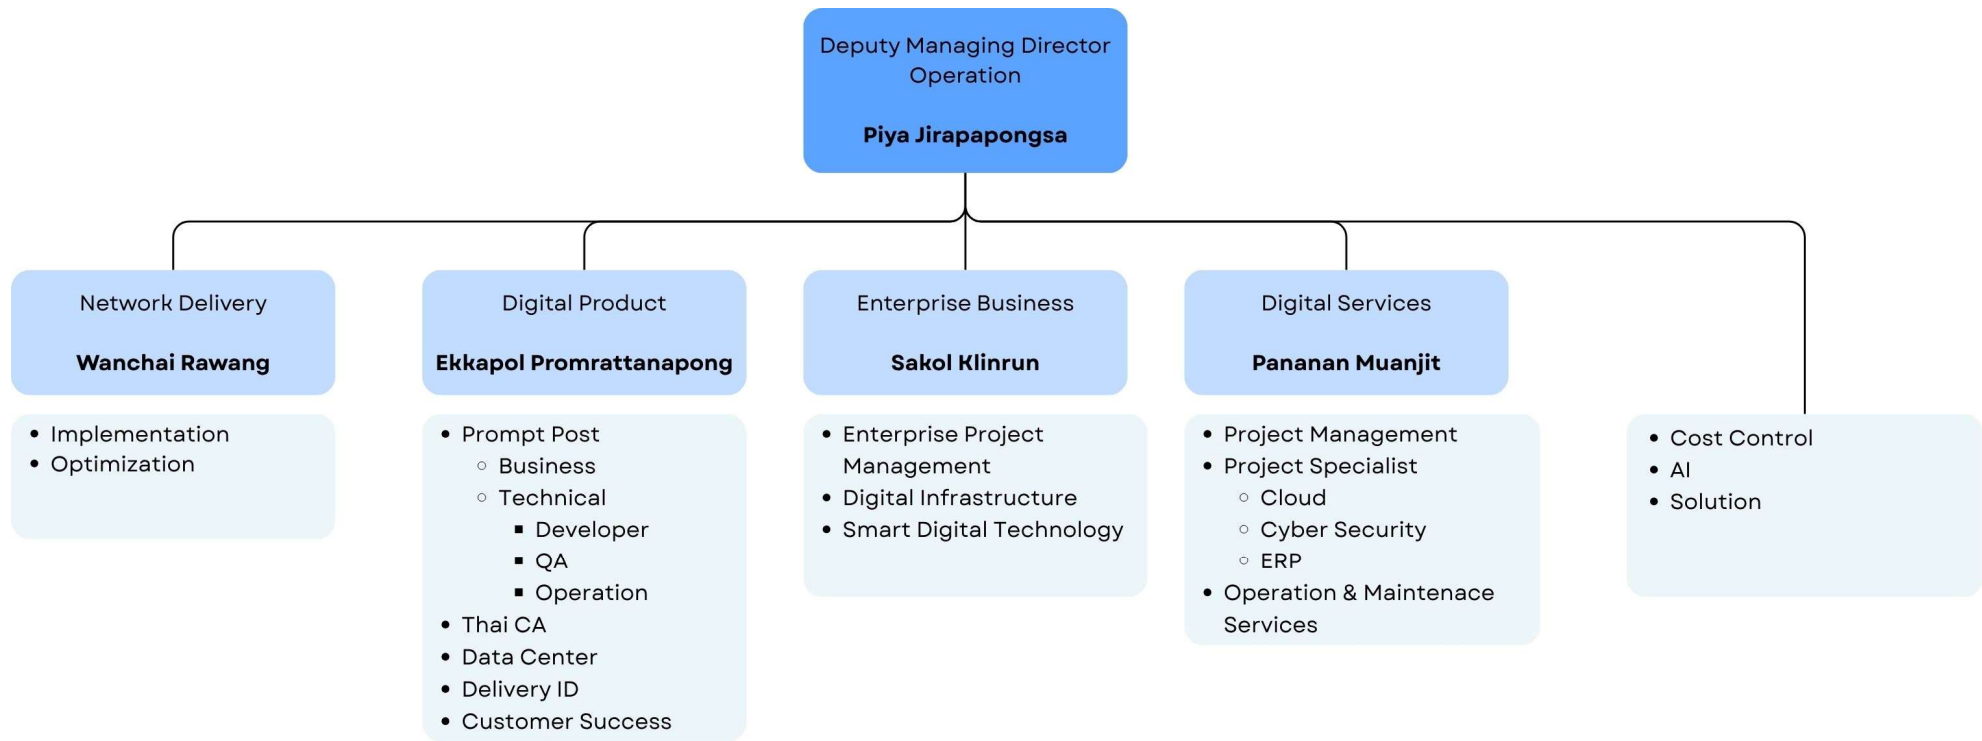

PMO Strategic Roadmap



EXECUTIVE SUMMARY Focusing on standardized governance in Q2, enabling operational control in Q3, and optimizing for value realization & predictive insights in Q4.

Q2 : Standardize

Q3 : Control & Enable

Q4 : Optimize

STRATEGY

Governance

Establish single source of truth and standardized project execution framework.

Efficiency

Implement portfolio controls and upskill capabilities for predictable delivery.

Value

Maximize ROI through data-driven decisions and continuous innovation.

KEY ACTIVITIES

PMO Governance Framework

Roles, Responsibilities & Processes

People Development

KM & Training Academy & Communities

Gate Review & Control

Go/No-Go Decision Framework

Project Visibility Dashboard

Real-time status tracking (V1.0)

Predictive Analytics

AI-driven Risk & Delay forecast

Value Realization

Outcome-based measurements

OUTCOME

✓ Standardized Ways of Working

- Role and Responsibilities
- E2E Process on PJ Delivery (Initiation – Closure)
- Std. Manday Rate of Prof. Services
- Project Document Template
- Centralized Project Tracking Tools

✓ Training – Project Management

✓ QA.QC – Quality Gate Review

- ✓ Centralized Portfolio Dashboard
- ✓ Centralized Resource View

✓ Standardized Ways of Working

- E2E Process on Support (both WA and MA)

✓ Value Realization Report

✓ Automated Decision Support

✓ IS/Partner on Shelf

✓ Standardized Ways of Working

- E2E Process on Sales (Cost Estimation Std.)

Success Metrics

Adoption

% Project uses Std. Template

Efficiency

1. Risk Identification
2. Decrease Skill Gap and Communication Gap

Success

% Project Success

PMO Governance Framework



Objective

1

WHAT – What are we doing?

- Define “Who does what?”
- Classify Scope of each Role
- Identify the owner of each activity and deliverable
- Reduce overlap & gaps between teams

→ Make
ownership
visible and
accountable

→ Lack of clarity = Project risk

?

WHY – Why this matters?

- Task overlap
- Unclear ownership and handoff
- Miscommunication between teams

HOW – How we will we work together?

- Define R&R for each function.
- Use RACI Framework. (Responsible / Accountable / Consulted / Informed)
- Map roles to each phase
- Align together


3

→ Align → Agree → Apply → Monitor

Roles and Responsibilities : Hand Over Process


1. Project Code
2. Customer's TOR
3. All Proposal from Customer and 3rd Parties
4. All Contracts/ SOW (Statement of Work) from Customer and 3rd Parties
5. Manday Estimation and Cost-Sheet
6. Business Cases
7. Stakeholder Register
8. Risk & Assumption Log
9. Demo/ POC (If have)
10. Internal Kick-Off Meeting to Hand Over to Delivery Team

1. Project Code
2. Customer's TOR
3. All Proposal from Customer and 3rd Parties
4. Project Plan and Kick-Off Doc.
5. Req. & Design Doc.
6. Build & Dev. Result Doc.
7. Testing Doc. (ST/UAT)
8. Deployment & Go-Live Result Doc.
9. Project Closure Report
10. Risk & Assumption Log
11. Internal Kick-Off Meeting to Hand Over to Support Team
12. User Training Doc. & Knowledge Transfer
13. Troubleshooting Basic Guide for Tier 1/ Call Center



1. Project Code
2. SOP (Support Workflow/ SLA/ Escalation Patch)
3. Incident & Problem Management
4. CR Management
5. System Monitoring & Health Report (Performance / Availability)
6. Maintenance & Patch (Version Upgrade)
7. Service Review Report (Monthly/Quarterly)

Roles and Responsibilities : Non-Product & Product Solution

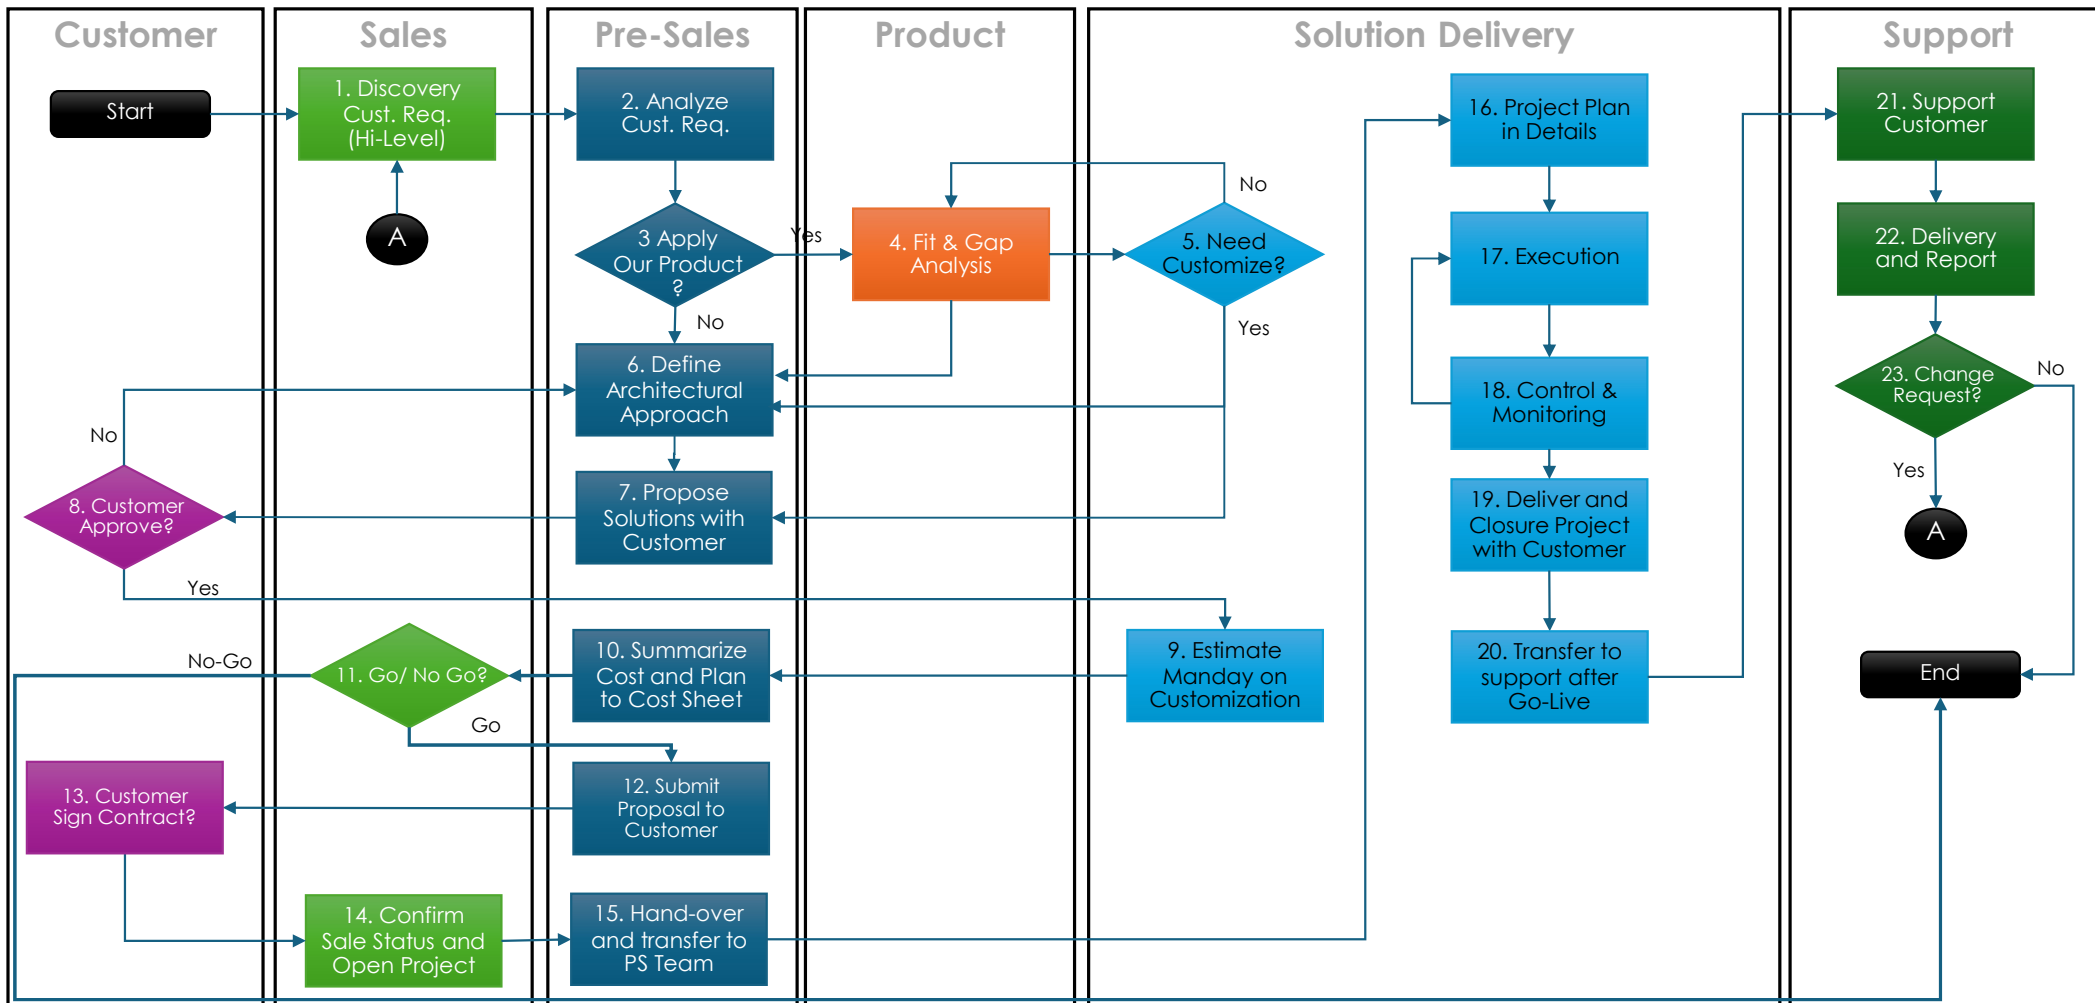

Project Management Process : I/O

Process
Group

Initiation

Planning

Executing

Monitoring &
Controlling

Closing

Activities

Authorize the Work

Define a new project or new phase, identify stakeholders, and obtain authorization

Plan the Work

Develop an integrated project management plan to attain project objectives

Work the Plan

Complete the work and satisfy project objectives

Control the Plan

Track and review project progress and performance; manage variance and change

End the Work

Finalize all activities and formally close the project or phase

Key
Outputs

- Project Charter
 - Agreement
 - Project Statement of Work (SOW)
 - Business Cases
 - Enterprise Env. Factor/T&C
 - Org. Process Assets
 - Cost Sheet
- Stakeholder Register

- WBS, Project Mgt. Plan & Related Document
- Requirement
- Scope
- Schedule
- Cost
- Quality
- Human Resources
- Communication
- Risk
- Procurement
- Change
- Stakeholder

- Project Deliverables
- Work Performance Data
- Team Performance Assessments
- Project Communications (ex. status reports)
- Selected Suppliers & Agreements
- Change Requests
- Issue & Risk Logs

- Change Logs
- Approved Change Requests
- Work Performance Info.
- Schedule Forecasts
- Updates the Project Plan
- Quality Controls Measurements
- Verified Deliverables
- Accepted Deliverables

- Final Product, Service, or Result (ex. purpose of project)
- Closed Procurement (ex. Formal signature of acceptance)

Roles and Responsibilities : Key Deliverables

Product Manager (Product Owner) เจ้าของ "ความต้องการของสิ่งที่สร้าง + Biz. Outcome" • Product Vision & Strategy • Product Roadmap (prioritized) • Approved Requirement / Scope • UAT Sign-off (ยืนยันว่า "ตอบโจทย์ธุรกิจ") • Business KPI / Outcome (adoption, revenue, usage)	Project Manager (PM) เจ้าของ "การส่งมอบให้สำเร็จตามแผน" • Project Plan & Timeline • Resource & Budget Plan • Risk / Issue Management • Action Tracking / Follow-up ครบถ้วน • Status Report (ผู้บริหารเห็นภาพชัด) • Go-live Readiness (พร้อมปล่อยระบบ)	Project Coordinator (PC) ตัวขับเคลื่อน execution ให้แผน "เกิดขึ้นจริง" • Minute of Meeting & Decision Log • Dependency & Issue Coordination • Document Control & Version Tracking • Deliverable Submission Record
Business Analyst (BA) เจ้าของ "ความชัดของ business requirement" • Business Requirement Document (BRD) • User Stories + Acceptance Criteria • Process Flow (As-Is / To-Be) • UAT Test Scenario (ฝั่ง business) • UAT Sign-off • User Training Document	System Analyst (SA) เจ้าของ "solution ที่ build ได้จริง" • System Requirement Document (SRD) • Technical Specification Document (TSD) • Solution Design / Architecture • System Flow / Integration Spec • Impact Analysis (ระบบที่เกี่ยวข้อง)	UX/UI Designer เจ้าของ "ประสบการณ์ผู้ใช้" • User Journey / User Flow • Wireframe / Prototype • UI Design (พร้อม dev handoff) • Usability Validation
	Developer (Front / Back / Mobile / Infra) เจ้าของ "ตัวระบบที่ใช้งานได้จริง" • Developed Features (ตาม spec) • Code Quality / Review • Deployment Package / Release • System Performance & Stability	QA (Quality Assurance) เจ้าของ "คุณภาพก่อนปล่อย" • Test Plan / Test Cases • Defect Report & Tracking • Test Result / Quality Report • Release Sign-off

Roles and Responsibilities : Deliverable (1/7)

	PMO	Team Lead of PM	Team Lead of BA & UX/UI	Team Lead of Quality
Role	Governance & Enablement	Delivery Owner	Business Value Owner	Quality Owner
	กำกับภาพรวมการบริหารโครงการทั้งองค์กรให้สอดคล้องกลยุทธ์และมาตรฐานเดียวกัน	ผู้นำทีม PM ดูแลการส่งมอบโครงการให้สำเร็จตามแผนและมาตรฐาน PMO	ผู้นำทีม BA เพื่อแปลงความต้องการธุรกิจเป็น Solution ที่ชัดเจน ถูกต้อง และนำไปพัฒนาได้จริง	ผู้นำทีม Quality Assurance & Control ให้ระบบมีคุณภาพตามมาตรฐานและตามความคาดหวังของลูกค้า
Responsibilities	1. วาง PMO Strategy, Framework และ Governance 2. กำหนดมาตรฐาน Proj. Management (Methodology, Template, Tools) 3. บริหาร Project Portfolio / Program / Strategic Initiatives 4. กำกับการบริหารทรัพยากร Resource & Capacity ระดับองค์กร 5. บริหารความเสี่ยงระดับองค์กร (Portfolio Risk) 6. รายงานสถานะโครงการต่อผู้บริหาร	1. กำกับและ Coaching และ Review งาน PM ในโครงการต่าง ๆ (Project Plan, Schedule, Budget, Risk) 2. แก้ไขปัญหาโครงการระดับ Escalation 3. จัดสรร PM ให้เหมาะสมกับขนาดและความซับซ้อนของงาน 4. ติดตาม Performance ของ PM	1. วาง BA Standard, Template และ Best Practice 2. กำกับและ Coaching และ Review งานทีมโดยโฟกัส Scope & Change Request ด้าน Requirement 3. จัดสรร BA ให้เหมาะสมกับขนาดและความซับซ้อนของงาน 4. ติดตาม Performance ของ BA และ UX/UI	1. วาง QA/QC Standard, Strategy และ Test Approach 2. กำกับและ Coaching และ Review งานของทีม (FT, SIT, UAT, Regression Test) 3. บริหาร Defect, Root Cause และ Quality Metrics on Functional Test/ SIT 4. ผลักดัน Test Automation และ Process Improvement 5. ติดตาม Performance ของ QC/QC
Key Deliverables	1. Proj. Management & Governance Framework 2. Portfolio Dashboard & Executive Report 3. Resource & Capability Plan 4. PM/BA/QA Competency Framework & IDP 5. Post-Implementation Review & Benefits Realization	1. Approved Project Plan & Baseline 2. Consolidated Project Status Report 3. Risk / Issue Escalation Log 4. Lessons Learned (Project Level) 5. PM Skill Development Plan	1. Approve BRD / Use Case / User Story 2. Change Request Analysis 3. Biz Requirements Walkthrough & BRD Sign-off 4. UAT Sign-off 5. BA และ UX/UI Skill Development Plan	1. Test Strategy & Test Plan 2. Test Case / Test Script 3. Defect Report & Quality Dashboard 4. UAT Sign-off 5. Quality Improvement Report 6. QA/QC Skill Development Plan
Key Success	1. % Project uses Std. Template 2. % Project Success	1. PM มีความเป็นมืออาชีพและเติบโต 2. Proj. Deliverable (On SOW/ Time/ Budget) 3. ลดการ Escalate ถึงระดับผู้บริหาร 4. ลูกค้าและ Stakeholder พึงพอใจ	1. BA มีความเป็นมืออาชีพและเติบโต 2. Requirement ชัดเจน ลด Rework 3. Dev และ QA เข้าใจ Requirement ตรงกัน 4. Requirement Creep จะต้องไปออกเกิน TOR ถ้ามีงานนอก ต้องให้ Est. เข้า CR Process กับ PM 5. ลูกค้ารับมอบตรงตามความต้องการจริง	1. QA/QC มีความเป็นมืออาชีพและเติบโต 2. ระบบผ่าน UAT ตามแผน 3. %Defect Critical ใน Production (With Condition by Proj.) 4. คุณภาพซอฟต์แวร์สม่ำเสมอ 5. ทีม QA ผลักดันให้มีการ Stakeholder ภายใน ตามบริบทของโครงการ จนสำเร็จ

Roles and Responsibilities : Deliverable (2/7)

	PM (Project Manager)	PC (Project Coordinator)
Role	Delivery Ownership ขับเคลื่อนโครงการให้สำเร็จตามเป้าหมาย เวลา งบประมาณ และคุณภาพ แบบ E2E ถ้า PM คือ คนขับ PC คือ คนเช็คเส้นทาง คนเติมน้ำมัน และประสานทุกด้านให้ผ่านราบรื่น	Execution Orchestrator สนับสนุนการบริหารโครงการด้านการประสานงาน เอกสาร การติดตามสถานะ และควบคุมกระบวนการ ให้โครงการดำเนินไปตามแผนอย่างมีระบบ
Responsibilities	- วางแผนโครงการ (Scope, Schedule, Cost) - บริหารความเสี่ยง ปัญหา และการเปลี่ยนแปลง (Risk / Issue / Change) - ประสานงานทุกฝ่าย (Business, Tech, Vendor, Customer) - ควบคุมคุณภาพงานส่งมอบ - รายงานความคืบหน้าและ Escalate เมื่อจำเป็น - รับผิดชอบผลลัพธ์ของโครงการ (E2E)	- ประสานงานทุกฝ่าย (Business, Tech, Vendor, Customer) - จัดประชุมและติดตาม Action Log - ดูแล Version Control และ Document Repository - ตรวจสอบความครบถ้วนของ Deliverables - สนับสนุน PM ในการติดตามความคืบหน้า Deliverables ของแต่ละทีม - สนับสนุนขั้นตอน Approval / Sign-off - รวบรวมข้อมูลเพื่อใช้วิเคราะห์สถานะโครงการ - ติดตาม Budget Tracking (กรณีได้รับมอบหมาย)
Key Deliverables	- Project Plan / Release Plan - Risk, Issue & Change Log - Stakeholder Commu. Plan & Status Report - Go-live Readiness Checklist - Post Implementation Review	- Meeting Minutes (MOM) พร้อม Action List - Action & Issue Log - Document Control & Version Tracking - Deliverable Submission Record
Key Success	- Proj. Deliverable (On SOW/ Time/ Budget) - ผู้ใช้งานยอมรับระบบ (Adoption and Sign-Off) - ความเสี่ยงถูกจัดการก่อนกระทบธุรกิจ - ทีมงานได้ต่อเนื่อง ไม่ Burnout	- เอกสารถูกต้อง ครบถ้วน และอัปเดตทันเวลา - ไม่มี Deliverable หลุดเพราะเอกสารไม่ครบ - Action Item ถูกติดตามและปิดได้ตามกำหนด - ลดงานธุรการของ PM ทำให้ PM โฟกัสเชิงบริหารได้ - Project Communication ชัดเจน ไม่มี Miscommunication

Roles and Responsibilities : Deliverable (3/7)

	BA (Business Analyst)	SA (System Analyst)
Role	Business Value Translator	System Analysis and Design
	เชื่อม Business Needs → Solution ที่ใช้งานได้จริง	ออกแบบระบบให้ตอบโจทย์ธุรกิจและรองรับเชิงเทคนิค
Responsibilities	1. เก็บและวิเคราะห์ Biz. Requirement 2. แปลง Biz. Requirement เป็น Func. Req. 3. วิเคราะห์ Process / Gap / Impact 4. จัดทำ BRD, Use Case, User Story 5. สนับสนุน UAT และยืนยันว่า Solution ตอบโจทย์ธุรกิจ 6. ทำงานใกล้ชิดกับ PM และ SA	1. แปลง Biz. Requirement เป็น System Requirement 2. ออกแบบ Functional / Non-Functional Requirements 3. วิเคราะห์ Business Process & System Impact 4. จัดทำ SRS, ER Diagram, API Spec 5. สนับสนุน SIT & UAT & Go-Live 6. ประสานงานกับ BA/ TL / Dev. 7. สนับสนุนความพร้อมในการ Go-Live
Key Deliverables	1. Biz. Requirement Doc (BRD / Use Case / User Story) & Sign-off 2. Requirement Traceability Matrix (RTM) 3. UAT Scenario & Acceptance Criteria & Sign-off 4. User Training & Material	1. Functional/ System Requirement Doc (SRS) & Sign-off 2. Functional Specs / API Specs/ Interface Control Document (ICD) 3. Requirement Traceability Matrix (RTM) 4. NFR (Security / Performance) 5. UAT Support Materials
Key Success	1. Solution ตอบโจทย์ Business Outcome 2. ลด Manual / Cost / Lead Time 3. ผู้ใช้เข้าใจและยอมรับระบบ 4. Scope Creep ถูกควบคุม - Requirement จะต้องไปออกเกิน TOR ถ้างอกต้องเข้ากระบวนการ CR Approval	1. Requirement ชัด ลด Rework 2. ระบบตรงตามความต้องการธุรกิจ UAT ผ่านตามแผน 3. Scope Creep ถูกควบคุม - Requirement จะต้องไปออกเกิน TOR ถ้างอก ต้องเข้ากระบวนการ CR Approval 4. Go-Live ได้อย่างราบรื่น

Roles and Responsibilities : Deliverable (4/7)

	UX/UI	QA (Quality Assurance)	QC (Quality Control)
Role	Human-Centered Solution Designer	Quality Inspector	Quality Gatekeeper
	ทำให้ Digital Solution ใช้งานง่าย ตอบโจทย์ผู้ใช้ และเพิ่ม Adoption	ประกันคุณภาพระบบก่อนส่งมอบ	ตรวจสอบว่าทำถูกต้องตาม Process & Compliance ของหน่วยงานหรือไม่?
Responsibilities	1. User Research / Journey / Persona 2. UX Flow, Wireframe, Prototype 3. UI Design ตาม Brand & Design System 4. Usability Testing & Iteration (Only Special / Strategic Project)	1. วาง Test Strategy / Test Plan 2. จัดทำ Test Case / Test Script 3. ดำเนินการ FAT/ SIT / UAT Support 4. ตรวจสอบ Bug, Defect และ Regression 5. User Management Control 6. ยืนยันคุณภาพก่อน Go-Live 7. รายงานคุณภาพระบบต่อ PM / PMO	1. ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารโครงการ 2. ตรวจสอบการปฏิบัติตาม SOP / Template 3. Audit Process ระหว่าง Project 4. ตรวจสอบ Deliverable ก่อนส่งลูกค้า 5. ตรวจสอบ Change Control และ Version Control 6. Report Non-Conformance (NC) ให้กับทีมงานและผู้บริหาร
Key Deliverables	1. User Journey Map 2. Wireframe / Prototype 3. UI Design & Design System 4. Usability Test Report (Only Special / Strategic Project)	1. Test Strategy & Test Plan 2. Test Case / Automation Script 3. Defect Report & Quality Dashboard 4. UAT Sign-off Document 5. Regression Test Result 6. User and Admin Manual	1. QC Checklist 2. Quality Review Report 3. Non-Conformance (NC) Report 4. Process Audit Report 5. Corrective Action Tracking Log
Key Success	1. ผู้ใช้มองเห็นภาพจำลอง และยอมรับระบบ (High Adoption) 2. ลด Error จากการใช้งาน 3. ผู้ใช้งานได้ตาม Requirement (UX Satisfaction สูง)	1. %Defect Critical ใน Production (With Condition by Proj.) 2. ระบบผ่าน UAT ครั้งแรก (With Condition by Proj.) 3. ความมั่นใจของ Business ต่อระบบ 4. Go-live ราบรื่น	1. ลดการส่งงานผิด Format / ผิดมาตรฐาน 2. ลด Defect ที่เกิดจาก Process Error 3. ลดการ Reject จากลูกค้า 4. มี Traceability ชัดเจน 5. องค์กรมีมาตรฐานเดียวกันทุกโครงการ

Roles and Responsibilities : Deliverable (5/7)

	Team Lead of SW Development	Team Lead of Infra & IT Solution
Role	SW Delivery Engine Owner	Infra & IT Solution Owner
	ผู้นำการพัฒนาซอฟต์แวร์ในระดับองค์กร รับผิดชอบการส่งมอบระบบให้สอดคล้องกลยุทธ์และมาตรฐานเดียวกัน	ผู้นำด้านโครงสร้างพื้นฐานและ Solution Platform ทำให้ระบบ IT พร้อมใช้งาน ปลอดภัย และรองรับการเติบโตของธุรกิจ
Responsibilities	1. บริหาร Software Delivery Portfolio 2. ควบคุมภาพเชิงเทคนิค & Architecture 3. ลด Technical Debt 4. พัฒนาทีม Software Application 5. วาง SDLC / Agile / DevOps Process 6. เชื่อม Business – Technology – Team 7. สนับสนุนความพร้อมในการ Go-Live	1. บริหาร Infra / Cloud / Network Architecture Portfolio 2. ควบคุมภาพเชิงเทคนิค & Architecture 3. ลด Technical Debt 4. พัฒนาทีม Infra & Security and IT Solution 5. วาง Capacity, DR, Security Process 6. ดูแล Env. (DEV/UAT/PROD) 7. สนับสนุนความพร้อมในการ Go-Live
Key Deliverables	1. Software Delivery Roadmap 2. Architecture & Coding Standards 3. Release & Capacity Plan 4. Technical Debt & Improvement Plan 5. Team Skill Matrix & Development Plan	1. Infrastructure Architecture Roadmap 2. Infra & Security and IT Solution Standards 3. Capacity & DR Plan 4. Technical Debt & Improvement Plan 5. Team Skill Matrix & Development Plan
Key Success	1. % Project Success (ตรงแผนและคุณภาพ) 2. Technical Debt ลดลงต่อเนื่อง 3. ทีมทำงานได้ยั่งยืน (Low Attrition) 4. ความเสถียรและความปลอดภัยสูง 5. รองรับขยายระบบในอนาคต	1. % Project Success (ตรงแผนและคุณภาพ) 2. Technical Debt ลดลงต่อเนื่อง 3. ทีมทำงานได้ยั่งยืน (Low Attrition) 4. ความเสถียรและความปลอดภัยสูง 5. รองรับขยายระบบในอนาคต

Roles and Responsibilities : Deliverable (6/7)

	Dev. Lead	Developer	DevOps
Role	Build the Right Technical Direction	Build the Right Solution	Deploy & Operational Stability
	ผู้นำด้านเทคนิค คุมคุณภาพการพัฒนา	พัฒนาระบบตามแบบและมาตรฐานที่กำหนด	เชื่อม Development + Operation ให้ระบบเสถียรและ Deploy ได้เร็ว
Responsibilities	- กำหนด Development Plan - กำหนด Technical Direction & Coding Std. - ออกแบบ Solution ร่วมกับ SA / Architect - Review Code & Solution Quality - Security & Access Control Policy - แก้ปัญหาเชิงเทคนิคที่ซับซ้อน - เป็นที่ปรึกษาทางเทคนิค (Mentor) ให้ทีม Dev - สนับสนุนความพร้อมในการ Go-Live	- Develop ตาม Requirement & Design และตาม Coding Standard - Unit Test และแก้ไข Bug - ทำงานร่วมกับ SA, Tester, DevOps - ส่งมอบงานตามแผนที่กำหนด - สนับสนุนความพร้อมในการ Go-Live	- วาง CI/CD Pipeline - Software Design (Open-Source, Third-Parties) - Config Environment (Dev / UAT / PROD) - Automate Build, Test, Deploy - Implement Monitor System, SW Performance - ดูแล Infrastructure, Cloud, Security & Access Control Policy - สนับสนุนความพร้อมในการ Go-Live และ Operation
Key Deliverables	- Technical/ System Design Doc. (SDS) - Technical Architecture & Standard - Code Review & Quality Guideline - Technical Risk Assessment	- Source Code / Feature Completion - Unit Test Result/ Technical Docs - Bug Fix & Enhancement Patch	- CI/CD Pipeline - Infrastructure as Code - Environment (Dev/UAT/Prod) - Monitoring & Alerting Dashboard - Incident & Rollback Plan – Application - Runbook
Key Success	- Code คุณภาพสูง Maintain ง่าย - ระบบเสถียร ขยายต่อได้ รองรับ Scale / Load - ลดปัญหา Technical Issue ซ้ำซ้อน - Defect ใน Production ต่ำ - Go-Live ได้อย่างราบรื่น	- Feature เสร็จตาม Sprint Plan - Code Quality สูง (Low Rework) Defect ต่ำ - ระบบทำงานได้ตาม Design - Collaborate กับทีมได้ดี - Go-Live ได้อย่างราบรื่น	- Deploy ได้ ถูกต้อง เร็วและปลอดภัย - ลด Manual Error - Downtime ต่ำ - ระบบรองรับการขยายตัว - Go-Live ได้อย่างราบรื่น

Roles and Responsibilities : Deliverable (7/7)

	System/ Solution Architect	Infra & Security	System/ Solution Engineer
Role	Build the Right E2E Architecture Designer	Platform & Reliability Enabler	Architecture Specialist
Responsibilities	ออกแบบ Solution ภาพรวมให้รองรับธุรกิจ ปลอดภัย และขยายได้	ดูแลและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน IT ให้พร้อมใช้งาน ปลอดภัย และขยายได้	ติดตั้ง ปรับแต่ง และทำให้ Solution ทำงานได้จริงตามที่ Architect ออกแบบไว้
Responsibilities	1. ออกแบบ High-Level Architecture (HLD) as E2E 2. กำหนด Technology Stack 3. กำหนด Integration & Data Flow & Security Design 4. Review Solution Design จากทีม Infra / SE 5. BCP/ Backup/ DR/ High Availability 6. ให้คำแนะนำเชิงกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยี 7. สนับสนุนความพร้อมในการ Go-Live	1. ออกแบบและดูแล Infra Architecture (Cloud / On-Prem / Hybrid) 2. Provision & Manage 3. Server / Network / Storage 4. Cloud Resources (VM, Container, Kubernetes) 5. ดูแล System Availability & Performance 6. Security Infrastructure 7. Firewall, IAM, Network Segmentation 8. BCP/ Backup/ DR/ High Availability 9. Support DevOps Pipeline (Env., CI/CD infra) 10. Incident & Capacity Management 11. สนับสนุนความพร้อมในการ Go-Live	1. วิเคราะห์ Requirement เชิงเทคนิคจาก BA/ SA/ Architect 2. ออกแบบ Low-Level Design (LLD) 3. ทำ Configuration / Installation / Integration 4. Troubleshoot ปัญหาเชิงเทคนิค 5. สนับสนุน Project Team ใน estimation และ feasibility 6. ทำ Handover ให้ทีม Operation / Support 7. สนับสนุนความพร้อมในการ Go-Live
Key Deliverables	1. Technical/ System Design Doc. (SDS) 2. Solution Architecture Diagram 3. Integration & Security Design 4. Technology Recommendation 5. Scalability Plan 6. Runbook/ BCP	1. Technical/ System Design Doc. (SDS) 2. Infrastructure Architecture Diagram 3. Env. Readiness (DEV / SIT / UAT / PROD) 4. SLA / Availability Report 5. DR & Backup Plan + Test Result 6. Capacity & Cost Optimization Report	1. Low-Level Design (LLD) 2. Configuration Document 3. Integration Specification 4. POC / Technical Validation Report 5. Installation & Deployment Guide 6. Knowledge Transfer Document
Key Success	1. Solution รองรับการใช้งานเติบโต 2. Risk ทางเทคนิคลดลง 3. Integration ราบรื่น 4. ระบบไม่ต้อง Re-Design บ่อย 5. BCP/ Go-Live ได้อย่างราบรื่น	1. ระบบมี Uptime สูง (High Availability) 2. Environment พร้อมใช้งานตามแผนโครงการ 3. รองรับ Scale เมื่อธุรกิจเติบโต 4. ความเสี่ยงด้าน Infrastructure ต่ำ 5. ต้นทุน Infrastructure ควบคุมได้ 6. BCP/ Go-Live ได้อย่างราบรื่น	1. ระบบทำงานได้จริงตาม Design 2. Integration สำเร็จ ไม่มี major issue ตอน Go-Live 3. แก้ปัญหาเชิงเทคนิคได้รวดเร็ว 4. ลด Rework จากการออกแบบผิดพลาด 5. ลูกค้าเชื่อมั่นด้าน Technical Competency

Roles and Responsibilities : RACI

No	Phase	PMO	PD	PM	PC	BA	UX/UI	SA	Other Technical	QA
0	Initiation	A	A	R	C	C	I	C	I	I
1	Planning & Kick-off	I	C	A	R	C	I	C	C	I
2	Requirement Definition	I	A	C	C	R	R	R	C	C
3	Analysis & Design	I	C	C	C	R	R	A	C	C
4	Dev. & Unit Test	I	I	C	C	I	C	C	A/R	C
5	System Integration Test	I	I	C	C	C	I	R	A	R
6	User Acceptance Test	I	A	C	C	R	C	C	C	C
7	Non-Functional Test	I	I	C	C	I	I	C	A	R
8	Training & Biz. Simulation	I	A	C	R	R	C	C	C	C
9	Site Preparation	I	I	A	R	I	I	I	R	I
10	Data Migration	I	C	C	C	C	I	C	A/R	C
11	PROD Deployment	I	I	C	C	I	I	C	A/R	C
12	PVT & Soft-Launch	I	A	C	C	C	C	C	R	R
13	Go-Live : Com. Launch	I	A	A (Delivery)	C	C	C	C	R	R
14	Project Closure	A	C	R	R	C	I	I	I	I
15	Warranty	I	C	C	C	C	I	C	A/R	R

R = Responsible (ลงมือทำ) | **A** = Accountable (เจ้าของผลลัพธ์) | **C** = Consulted (ให้คำปรึกษา) | **I** = Informed (รับทราบ)

Need Support for Next Actions

1. Timesheet Awareness – *Need to discuss with HR*
2. Std. Package Cost and Std. Manday Rate for Customization Solution/ Software Project – *Required K.Wanchai.R, K.Sakol.K, K.Pananan.M*
3. Conduct a PM alignment session on Ways of Working and Collaboration Practices.
– *HR will send lists of PM/PC*
 - Project Governance
 - Centralized Project Tracking Tools
 - Centralized Portfolio Dashboard
 - Training – Project Management



WHAT - What we need from you?

→ This works only if we all commit

TKC

- **Any Helps Needed**
Any Questions
Any Concerns
Any Suggestions
